



हरिहरपुरगढी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
भनभने सिन्धुली



नमस्कार

बार्षिक प्रगति समीक्षा-आ.व. २०७७/७८

प्रस्तुतकर्ता

नविन गडतान लामा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

परिचय

- प्रदेश :- संघीय गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेश
- जिल्ला :- सिन्धुली
- नाम :- हरिहरपुरगढी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, भनभने
- वडा संख्या :- ८
- केन्द्र :- साविक पिपलमाडी गा.वि.स.को कार्यालय, भनभने
- कुल क्षेत्रफल :- ३४३.७० बर्ग कि.मी


जनसंख्या विवरण

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्या तथा घरधुरी

- ❖ जम्मा जनसंख्या :- २७७२७
- ❖ पुरुष :- १२५६७
- ❖ महिला :- १५१६०
- ❖ जम्मा घरधुरी :- ४७००

सिमाना :

- ❖ पूर्वमा : मरिन गाउँपालिका
- ❖ पश्चिममा : मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका र रौतहट
- ❖ उत्तरमा : काभ्रे जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका
- ❖ दक्षिणमा : सर्लाही जिल्लाको हरिवन र बागमती नगरपालिका,

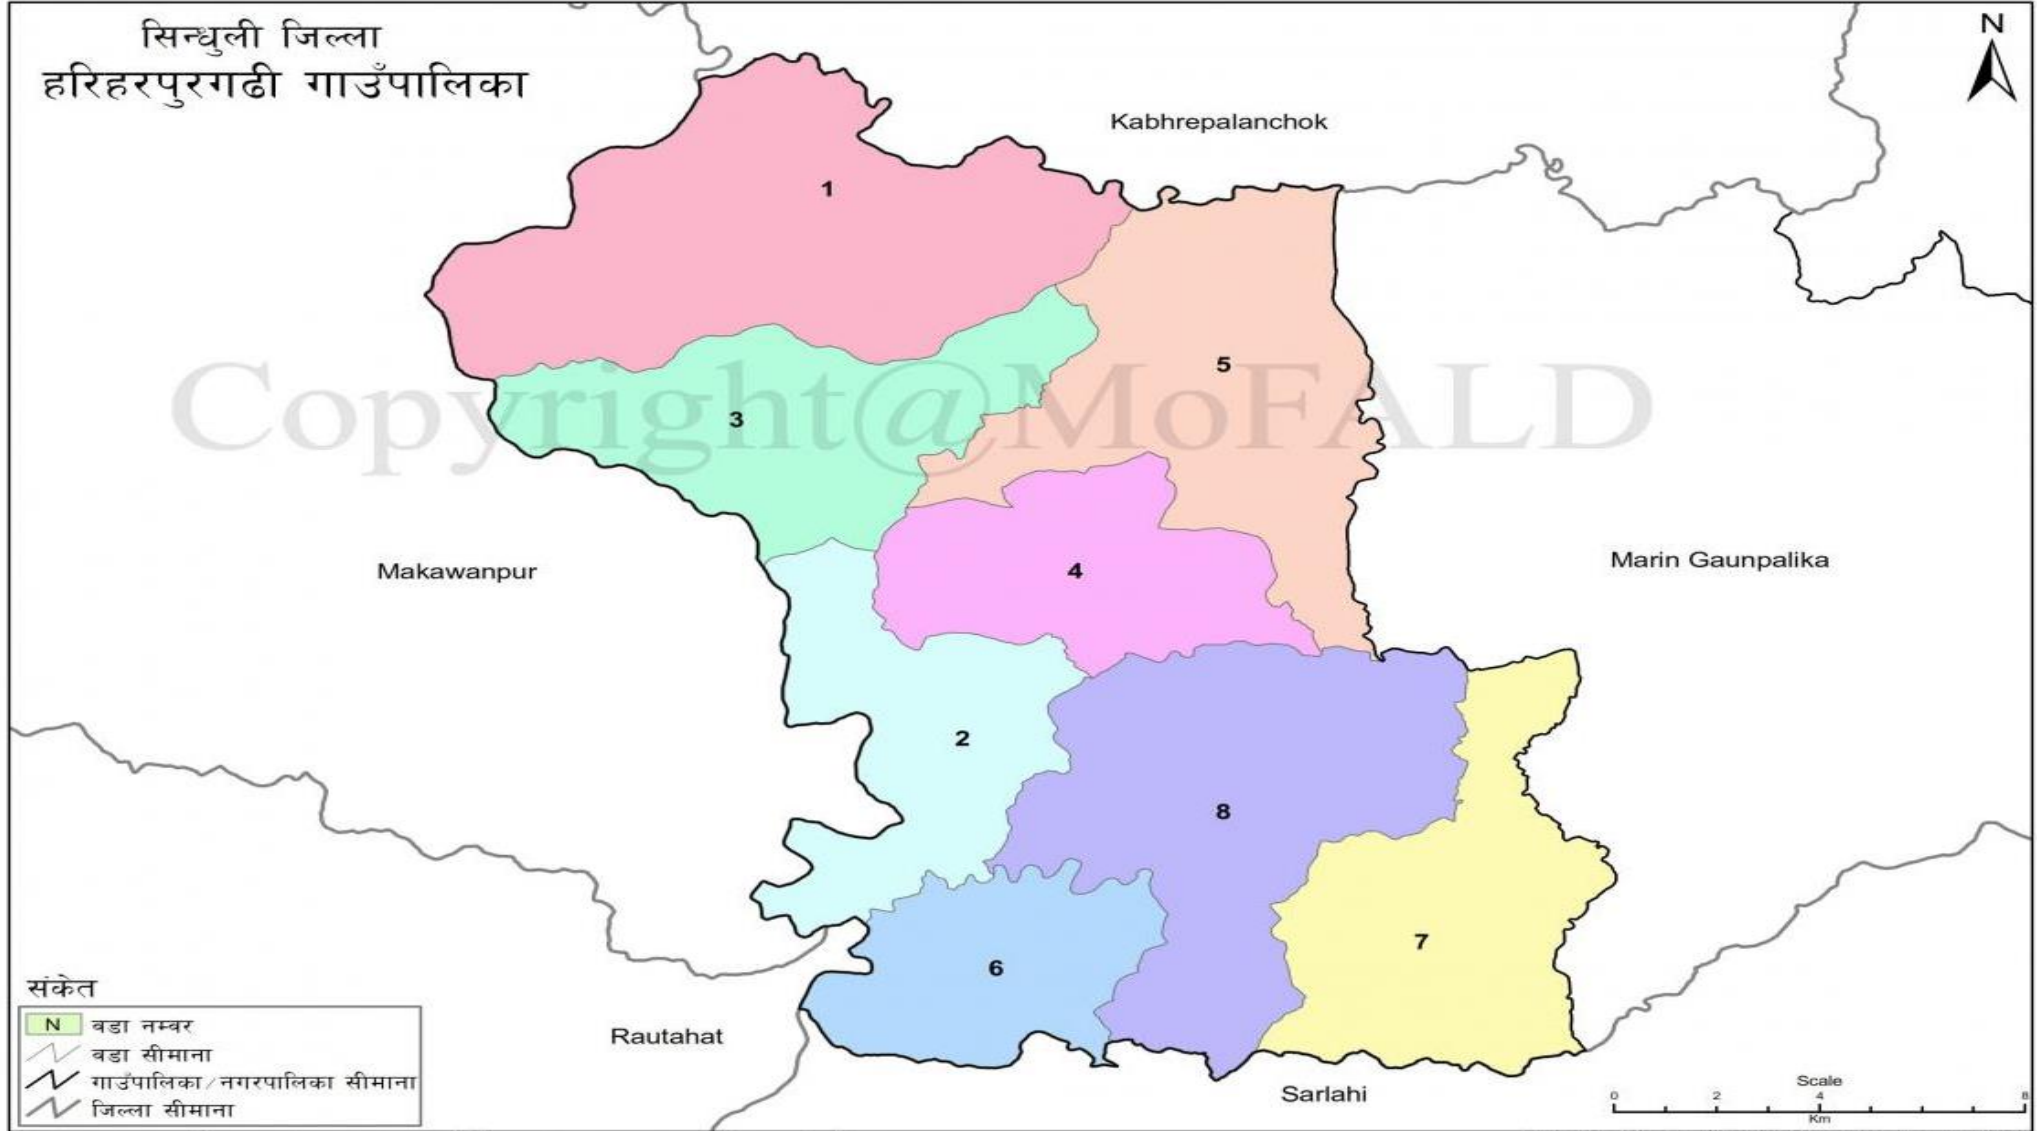

स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२५०००/१:५००००), नापी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग

Projection System: MUTM, Spheroid - Everest 1830
LLRC, 2016

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका नक्सा

आ.ब. ०७७/७८ समष्टीगत आय व्यय विवरण

क) आय व्यय विवरण हरु

सि.नं.	बजेट शिर्षक	विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको बजेट रु.	फिर्ता रकम रु.	खर्च प्रतिशत
१	कुल वार्षिक बजेट	५३१२५३८७०।००	४११३२६७३५।००	११९९२७१३५।००	७७.४५
२	कुल चालु खर्च	२८३६८६०८०।००	२२२२१६९२५।००	६१४६९१५५।००	७८.३५
३	कुल पुजिगत खर्च	२४१५६७७९०।००	१८९१०९८१०।००	५२४५७९८०।००	७८.३०
४	कुल आन्तरिक आय	६९५६०००।००	६९५६०००।००	०.००	१००.००
५	प्रदेश समपुरक	१५००००००।००	९६४३३६३।००	५३५६६३७।००	६४.२६
६	संघीय समपुरक	१६००००००।००	७३९९३७९।००	८६००६२१।००	४६.२५
७	संघीय सशर्त पुजिगत	९४७२०००।००	२७४७६८५।००	६७२४३१५।००	२९।००
८	संघीय सशर्त चालु	१६६५२१०८०।००	१३५२८१४०५।००	३२३९६७५।००	८१.२०
९	प्रदेश सशर्त पुजिगत	१३००००००।००	११३७९१४५।००	१६२०८५५।००	८७.४६

सि.नं.	बजेट शिर्षक	विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको बजेट रु.	फिर्ता रकम रु.	खर्च प्रतिशत
१०	प्रदेश सशर्त चालु	८७६३०००१००	५१३८८७२१००	३६२४१२८१००	५८.६३
११	प्रदेश विशेष अनुदान	३००००००१००	१३८३६०११००	१६१६३९९१००	४६.१०
१२	स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम	६५०००००१००	६१९६१५११००	३०३८४९१००	९५.३२
१३	प्रदेश पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम	१०००००००१००	८४४६६५३१००	१५५३३४७१००	८४.४६

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को प्रगति विवरण

सि.नं.	विवरण तथा सूचक	आ.व.२०७६।७७ को जम्मा	आ.व.२०७७।७८ को जम्मा	हालको जम्मा
१	सडक			
	नयाँ ट्रयाक खोल्ने (कि.मी)	४५.५०	४७.५०	९३.००
	सडक ग्राभेल (कि.मी)	५.५०	६.५०	१२.००
	सडक कालो पत्रे (कि.मी)	-	-	
	सडक स्तरोन्नती (कि.मी)	४८.५०	५०.५०	९९.००
	ढुंगा सोलिंग (कि.मि)	३.५०	४.५०	८.००
	ट्यूम पाइप कर्भट (वटा)	७.००	८.००	१५.००
	स्लाइब कर्भट (वटा)	२.००	५.००	७.००
	पक्क नाला (कि.मि)			
	कच्चि नाला (कि.मि)	११.५०	१२.५०	२४.००
	कजवे (वटा)	४.००	५.००	९.००
	कोबल/सोलिंग (कि.मि.)	१.५०	२.५०	४.००
	रिटेनिंग वाल (घ.मि)	१३५.००	१२३०.००	१३६५.००
	ग्याबियनअ (घ.मि)	३५००.००	६५००.००	१००००.००
२	भो.पु. निर्माण			
	भो.पु. निर्माण सम्पन्न	१.००	१.००	२.००
	भो.पु. क्रमागत (वटा)	१.००	२.००	३.००
	भो.पु. नियमित मर्मत (वटा)			

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को प्रगति विवरण

सि.नं.	विवरण तथा सूचक	आ.व.२०७७/७८ को जम्मा	आ.व.२०७७/७८ को जम्मा	हालको जम्मा
३	खानेपानी आयोजना			
	इनार सम्पन्न	३.००	५.००	८.००
	बोरिंग			
	इनटेक निर्माण	३.००	२.००	५.००
	धारा निर्माण	२५.००	४०.००	६५.००
	पाइप लाइन बिस्तार (कि.मि)	३.५०	१२.५०	१६.००
	रिजरभौयार टयांकी	३.००	६.००	९.००
	सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन (शौचालय निर्माण) वटा	२.००	२.००	४.००
४	सिंचाई (हेक्टर) मर्मत समेत	२५०	१५०	४००.००
५	विद्यालय भवन			
	भवन निर्माण सम्पन्न (वटा)	५	६	११.००
	भवन निर्माण क्रमागत (वटा)	३	२	५.००
	भवन मर्मत(वटा)	११	२.००	१३.००
	खेल मैदान निर्माण (वटा) स्कुल समेत	११	३.००	१५.००
	विद्यालय भवन जस्तापाता)बर्ग मीटर)	४०	००	४०.००

सि.नं.	विवरण तथा सूचक	आ.व.२०७७/७८ को जम्मा	आ.व.२०७७/७८ को जम्मा	हालको जम्मा
५	गुम्बा भवन			
	भवन निर्माण सम्पन्न (वटा)	३	३.००	६.००
	भवन निर्माण क्रमागत (वटा)	३	३.००	६.००
	भवन कम्पाउण्ड वाल निर्माण (मीटर)	३५०	१५०	५००.००
६	नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध			
	गेवियन लगाउने कार्य (घ.मी)	३५०० (२३५०) थान	२५०० (२१५०) थान	६०००.००
	रिटेनिड वाल RCC (घ.मी)	५५	०.००	५५.००
७	विद्युत उत्पादन			
	विद्युत उत्पादन (कि.वा)			
	ग्रामीण विद्युतीकरण तार खरिद (कि.मी.)	५.५	१.५०	७.००
	ट्रान्सफरमर खरिद	५	१	६.००
	पोल खरीद	१००	०	१००.००
८	खरको छाना हटाई जस्तापात लगाउने			
	जस्तापाताले छाना छाउने कार्य (ब.मी)	०	२५०.००	२५०.००

अनूकरणीय कार्यहरु

- गाउँपालिकाका विकास योजनाको तयारका लागि आवधिक विकास योजना तयार भएको ।
- गाउँपालिका वरपर रहेको ६४ विगाहा जग्गामा आँप, लिची, कटकर लगाएत अन्य विरुवा वृक्षारोपण गरेको ।
- बस्तुगत विकास योजना तयार अन्तिम चरणमा भएको ।
- आन्तरिक आयको लागि IEE प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
- आन्तरिक आयको लागि ऐलानी जग्गाको क्षेत्रफल एकिन गर्न लागिएको ।
- स्थाई भवन निर्माण गरि कार्यालय संचालन गरीएको ।
- ऐन, नियमावली तथा कार्यविधी १८ वटा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
- ऐतिहासिक हरिहरपुरगढी लाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन गुरु योजना तयार भएको ।
- निजी आवासिय भवन हरुको नक्सा अभिलेखिकरण तथा नियमित नक्सापासको काम सुरु गरेको ।

योजना कार्यान्वयनमा समस्या

- योजना संचालनमा उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाई भएकोले समयमा काम गराउन कठिनाई भएको ।
- आ.ब को चैत्र ११ देखि दोस्रो भेरियन्टको कोरोना भाईसरको कारणले लकडाउन भएकोले गर्दा संभौता भई सुरु भएका योजना तथा संभौता नभएका योजनाहरुको काममा व्यवस्थित गर्न कठिनाई ।
- गाउँपालिकामा आन्तरिक आय न्युन हुनु ।
- आर्थिक बर्षको अन्त्यमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुँदा बजारमा खरिद गर्नुपर्ने मेटेरियलको मुल्य अत्याधिक बढ्न जाने हुनाले काम गर्न कठिनाई हुने ।
- विधुत कहिले आउने र कहिले जाने ठेगान नहुनु ।
- प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुनु ।

चुनौतिहरु

- आफ्ना कार्यालय मार्फत गाउँपालिका भित्र सञ्चाल भएका योजना, कार्यक्रमहरुको अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नसक्नु ।
- कोविड १९ कोरोना भाईरस कहिले समाप्त हुने हो एकिन हुन नसक्नु ।
- **NGO/INGO** हरुलाई समेट्नु नसक्नु ।
- प्रत्येक वडामा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव ।
- गाउँपालिकाको आफ्नो जग्गा नहुनु ।
- गाउँपालिकामा विधुत विस्तार पुर्ण रुपमा संचालन नहुनु ।
- भौगालिक विकटता ।

गाउँपालिकाबाट संचालित योजना तथा गतिविधीका केही फलक



हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको १२ औँ गाउँसभा २०७७



दशौ गाउँसभामा उपस्थित भद्र भलादमी २०७८



गुर्जी हरिहरपुरगढी सडक निर्माण



योजनास्थलमा राखिएको होर्डिड बोर्डको नमुनाहरु



हरिहरपुरगढी गाउँपालिका कार्यालय भवन



वडा नं. ३ वडा कार्यालय भवन



वडा नं. १ स्वास्थ्य चौकी भवन



वडा नं २ को राई संघालय भवन



मोरङगे पतानी सडकमा लगाएको गेवियन रिटेनिड
स्ट्रक्चर



गुर्जी हरिहरपुरगढी सडकमा लगाईएको गेवियन
रिटेनिड वाल



काराकाठ खानेपानी ओभरहेड टयाँकी निर्माण वडा नं. २



काराकाठ खानेपानी धारा निर्माण वडा नं. २



दुवि आँपटार भो.पु. कोखाजोर खोला वडा नं. १



कुण्ड चडाउ भो.पु. बरुण खोला वडा नं. ७



भोर्लेनी पथराही सडक निर्माणमा सोलिड कार्य वडा नं. ७



क्यानखोला बन्चरे सडक निर्माणमा सोलिड कार्य वडा नं. २



वडा नं. २ सिंचाई कुलो निर्माण



भित्री खेत सिंचाई कुलो निर्माण वडा नं. २



थुम्कीखेत सिंचाईकुलो वडा नं. ५ मा बनाईएको
स्ट्रक्चर



वडा नं. ३ तमोर सिंचाई कुलोमा निर्माण भएको
आर सि सि क्यानल



खानेपानी कुवा ईन्टेक निर्माण



बागमती नदी नियन्त्रण तटबन्ध



तिनकुना खोला नियन्त्रण तटबन्ध



वडा नं. १ चपली सिंचाई कुलो



वडा नं. ३ बनौली सिंचाई कुलो निर्माण



वडा नं. ६ ठुलो कौवामा निर्माण भएको गुम्बा
भवन निर्माण



वडा नं. ६ शिखर प्रतिक्षलय निर्माण



गाउँपालिकाबाट संचालन भएका योजनाहरुको
जिल्ला समन्वय समितिबाट आउनुभएको अनुगमन
टोली



गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ईन्जिनियर सहितको
अनुगमन टोली



आदीवासी जनजातीहरुको पहिचानको सहितको कार्यक्रम २०७८

धन्यवाद

शुभाशुभ !
